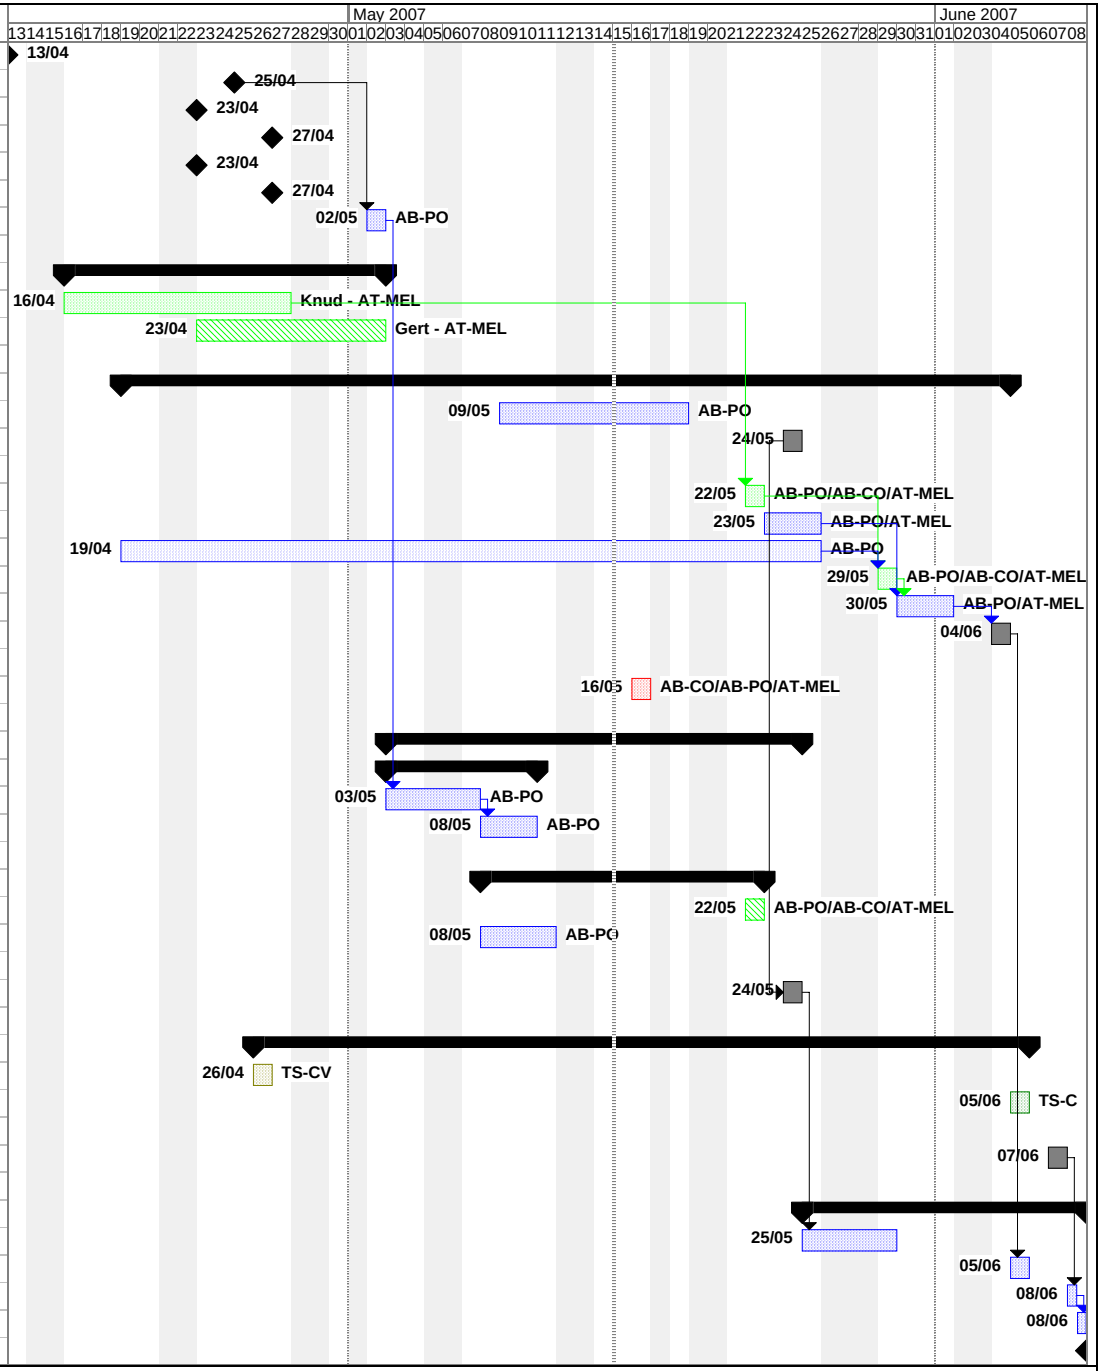ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece	Text1
1	AC distribution for EE sys	0 days	Fri 13/04/07	Fri 13/04/07		
2	AC distribution for PC	0 days	Wed 25/04/07	Wed 25/04/07		
3	Connection water cooled DC cables	0 days	Mon 23/04/07	Mon 23/04/07		
4	World Fip	0 days	Fri 27/04/07	Fri 27/04/07		
5	WiFi	0 days	Mon 23/04/07	Mon 23/04/07		
6	Balisage zone	0 days	Fri 27/04/07	Fri 27/04/07		
7	FGCs configuration	1 day	Wed 02/05/07	Wed 02/05/07	2	
8						
9	**EE - IST**	**12 days**	**Mon 16/04/07**	**Wed 02/05/07**		
10	13kA EE systems IST - 3sys	10 days	Mon 16/04/07	Fri 27/04/07		
11	600A EE systems IST - 29sys	7 days	Mon 23/04/07	Wed 02/05/07		
12						
13	**Circuits >=4kA**	**30 days**	**Thu 19/04/07**	**Mon 04/06/07**		
14	4-8kA powering tests - 18sys	7 days	Wed 09/05/07	Fri 18/05/07		
15	**8h run 4-8kA**	1 day	Thu 24/05/07	Thu 24/05/07		
16						
17	Interlock tests RQD&F.A23	1 day	Tue 22/05/07	Tue 22/05/07	10	
18	Powering tests RQD&F.A23	3 days	Wed 23/05/07	Fri 25/05/07		
19	Preparation RB.A23	5 wks	Thu 19/04/07	Fri 25/05/07		
20	Interlock tests RB.A23	1 day	Tue 29/05/07	Tue 29/05/07	17;19	
21	Powering tests RB.A23	3 days	Wed 30/05/07	Fri 01/06/07	20;18	
22	**8h run >= 8kA**	1 day	Mon 04/06/07	Mon 04/06/07	21	
23						
24	PIC interface tests	1 day	Wed 16/05/07	Wed 16/05/07		
25						
26	**Circuits <2kA**	**15 days**	**Thu 03/05/07**	**Thu 24/05/07**		
27	**NO EE sys**	**6 days**	**Thu 03/05/07**	**Thu 10/05/07**		
28	120A powering tests - 29 PC	3 days	Thu 03/05/07	Mon 07/05/07	7	
29	600ANOEE powering tests- 15 PC	3 days	Tue 08/05/07	Thu 10/05/07	28	
30						
31	**600A EE**	**10 days**	**Tue 08/05/07**	**Tue 22/05/07**		
32	600A-EE interlock tests - 16sys	1 day	Tue 22/05/07	Tue 22/05/07		
33	600A-EE powering tests	4 days	Tue 08/05/07	Fri 11/05/07		
34						
35	**8 hr run PC<2kA**	1 day	Thu 24/05/07	Thu 24/05/07	15SS	
36						
37	**Filter Cleaning**	**26 days**	**Thu 26/04/07**	**Tue 05/06/07**		
38	1st	1 day	Thu 26/04/07	Thu 26/04/07		
39	2nd	1 day	Tue 05/06/07	Tue 05/06/07		
40						
41	**24hr heat run test**	1 day	Thu 07/06/07	Thu 07/06/07		
42						
43	**Final tests - Test end**	**10 days**	**Fri 25/05/07**	**Fri 08/06/07**		
44	Polarity Check < 8KA	2 days	Fri 25/05/07	Tue 29/05/07	35	
45	Polarity Check > 8KA	1 day	Tue 05/06/07	Tue 05/06/07	22	
46	AUG- UPS test	0,5 days	Fri 08/06/07	Fri 08/06/07	41	
47	Retrait Balisage	0,5 days	Fri 08/06/07	Fri 08/06/07	46	
48	End	0 days	Fri 08/06/07	Fri 08/06/07	47
