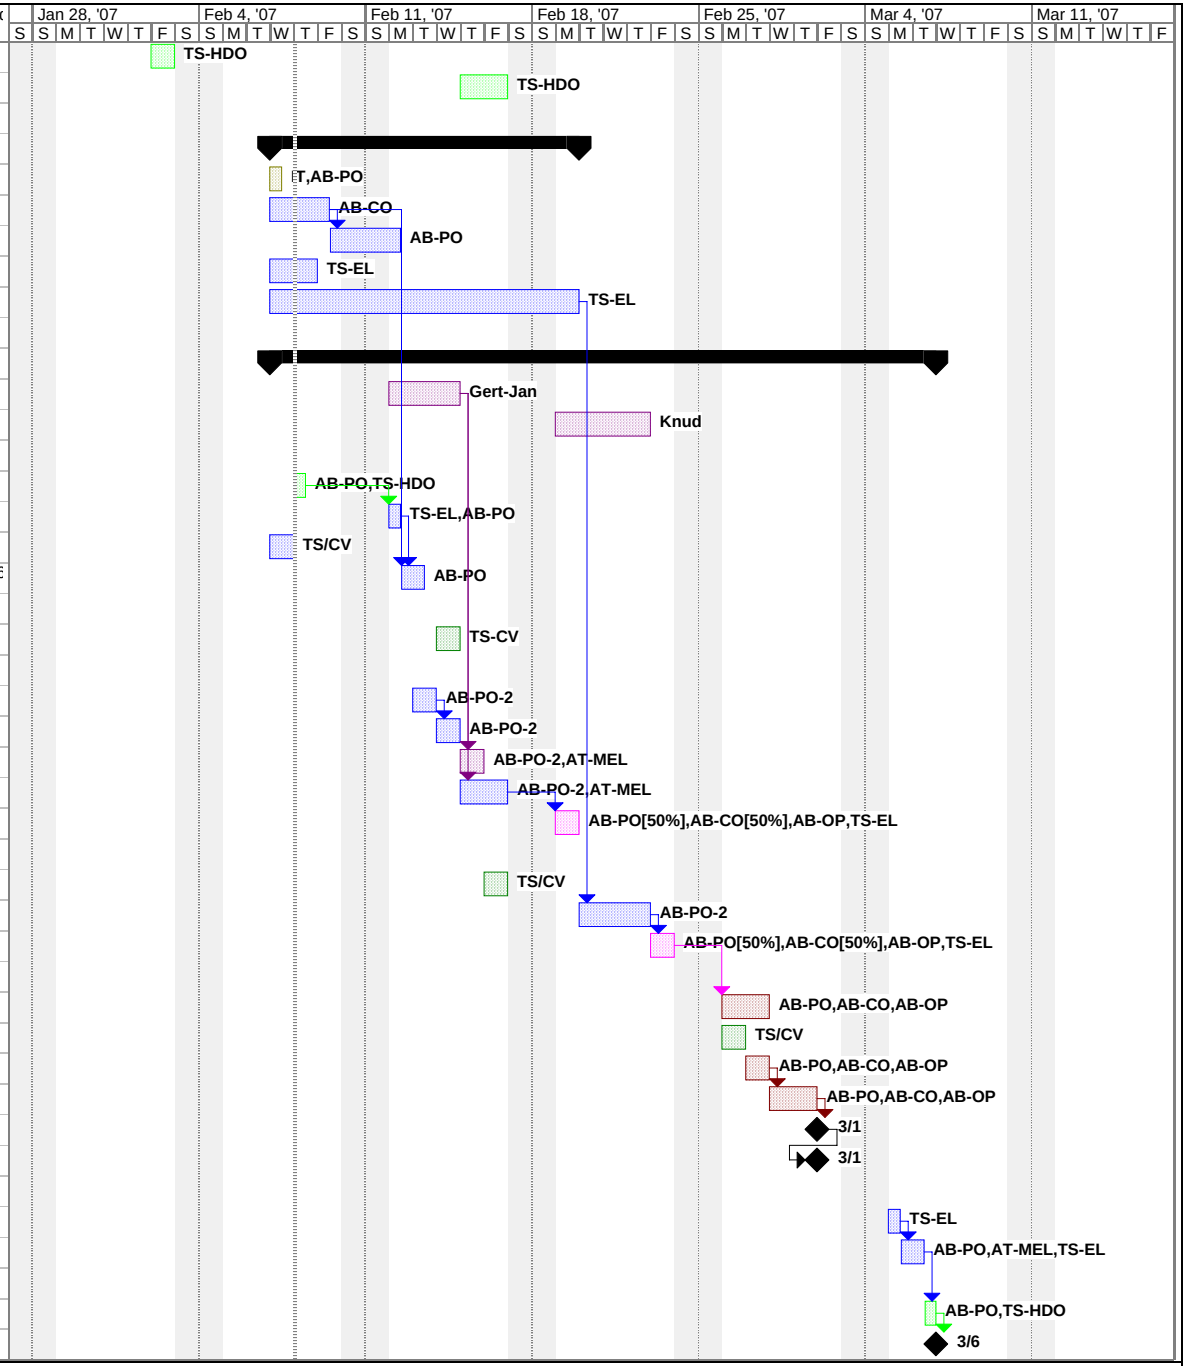ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Prec
1	Nettoyage RR73	1 day	Fri 2/2/07	Fri 2/2/07	
2	Nettoyage UJ76	2 days	Thu 2/15/07	Fri 2/16/07	
3					
4	**SCT Preparation**	**9 days**	**Wed 2/7/07**	**Mon 2/19/07**	
5	Validation WiFi	0.5 days	Wed 2/7/07	Wed 2/7/07	
6	WorldFIP	2.5 days	Wed 2/7/07	Fri 2/9/07	
7	Installation FGCs/bouchons	1 day	Fri 2/9/07	Mon 2/12/07	6
8	FGCs/Bouchons and UPS	2 days	Wed 2/7/07	Thu 2/8/07	
9	UJ76 Cabling	9 days	Wed 2/7/07	Mon 2/19/07	
10					
11	**SCT RR73&UJ76**	**20 days**	**Wed 2/7/07**	**Tue 3/6/07**	
12	600A EE systems IST	3 days	Mon 2/12/07	Wed 2/14/07	
13	13kA EE systems IST	4 days	Mon 2/19/07	Thu 2/22/07	
14					
15	Balisage zone	0.5 days	Thu 2/8/07	Thu 2/8/07	
16	Raccordement ERD1/RR73&UJ76	0.5 days	Mon 2/12/07	Mon 2/12/07	15
17	Nettoyage filtres RR73	1 day	Wed 2/7/07	Wed 2/7/07	
18	FGCs configuration	1 day	Mon 2/12/07	Tue 2/13/07	16,6
19					
20	Full power ventilation tests	1 day	Wed 2/14/07	Wed 2/14/07	
21					
22	RR73 - 120A powering tests	1 day	Tue 2/13/07	Tue 2/13/07	
23	RR73 - 600A powering tests	1 day	Wed 2/14/07	Wed 2/14/07	22
24	RR73 - 600A-EE interlock tests	1 day	Thu 2/15/07	Thu 2/15/07	12
25	RR73 - 600A-EE powering tests	2 days	Thu 2/15/07	Fri 2/16/07	12
26	RR73 - 120A&600A 8H heat run test	1 day	Mon 2/19/07	Mon 2/19/07	25
27					
28	Nettoyage filtres UJ76	1 day	Fri 2/16/07	Fri 2/16/07	
29	UJ76 - 600A powering tests	3 days	Tue 2/20/07	Thu 2/22/07	9
30	UJ76 - 600A 8hr heat run test UJ76	1 day	Fri 2/23/07	Fri 2/23/07	29
31					
32	PIC Interface tests	2 days	Mon 2/26/07	Tue 2/27/07	30
33	Nettoyage filtres RR73/UJ76	1 day	Mon 2/26/07	Mon 2/26/07	
34	CCC tests	1 day	Tue 2/27/07	Tue 2/27/07	
35	24hr heat run test	2 days	Wed 2/28/07	Thu 3/1/07	34
36	Service Electrique - I_nom - I_max	0 days	Thu 3/1/07	Thu 3/1/07	35
37	EE-QPS test at I_max	0 days	Thu 3/1/07	Thu 3/1/07	36
38					
39	AUG- UPS test	0.5 days	Mon 3/5/07	Mon 3/5/07	
40	Polarity Check	1 day	Mon 3/5/07	Tue 3/6/07	39
41					
42	Retrait Balisage	0.5 days	Tue 3/6/07	Tue 3/6/07	40
43	Test End	0 days	Tue 3/6/07	Tue 3/6/07	42
